



Spett.le
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PIAZZA V. EMANUELE II
41011 CAMPOGALLIANO (MO)

Modena, 04/02/2014

Offerta n. 21/14

Oggetto: Visita ispettiva Vs. impianto ascensore

Cod. Imp. 00000414 - VIA MARCONI 30 - DIREZIONALE R1 - CAMPOGALLIANO Matr. 018/2003

Nel corso della visita di ispezione periodica effettuata secondo il DPR-162/99 all'impianto elevatore in data 29/01/14, l'Ing. Adducci dell'Organismo Notificato "Sidel" ha prescritto quanto segue:

- 1) Le funi presentano un tratto sfregolato: tenere sotto controllo ed intervenire all'occorrenza.
- 2) Batterie manovra di emergenza non efficienti.

Precisiamo che, come previsto dall'art. 15 comma 5 e 6 del DPR 30 Aprile 1999, le riparazioni e/o sostituzioni necessarie alla corretta conservazione ed al mantenimento in sicurezza dell'ascensore devono essere eseguite tempestivamente onde evitare eventuali provvedimenti di fermo impianto.

Per ottemperare a quanto prescritto trasmettiamo di seguito preventivo di spesa.

Punto 1

Fornitura con installazione, previo bloccaggio della cabina sugli apparecchi di sicurezza, di n. 2 nuove **funi di trazione (1)** in acciaio speciale D. 6,4 mm come da caratteristiche riportate sul libretto di immatricolazione.

Messa in tiro dell'impianto e regolazione dell'uniformità di tensione.


Le nuove funi sono corredate di Certificati di Conformità e targhette regolamentari riportanti i dati richiesti dalle vigenti norme.

IMPORTO
(Iva esclusa)

€ 680,00
(SEICENTOTTANTA/00)



1

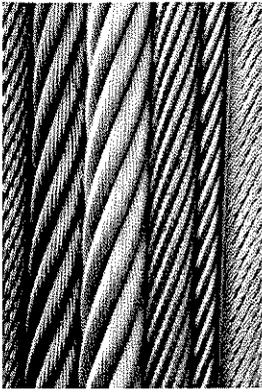


Punto 2

Sostituzione n. 4 **batterie al piombo (2)** da 12 V – 7,2 Ah per il circuito di manovra di emergenza.

IMPORTO
(Iva esclusa)

€ 120,00
(CENTOVENTI/00)



2

IMPORTO COMPLESSIVO

€ 800,00
(OTTOCENTO/00)

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

100% A LAVORO ULTIMATO

CONSEGNA

GG. LL. 30 DATA ORDINE

GARANZIA

24 MESI SUI SOLI MATERIALI SOSTITUITI

VALIDITA' OFFERTA

60 GG

Allegato: verbale di ispezione

IL COMMITTENTE

ESSEMMETI S.r.l.



SICUREZZA AMBIENTE QUALITA' INGEGNERIA
ORGANISMO NOTIFICATO EUROPEO n° 0895

VERBALE DI VERIFICA n. 59875

CODICE IMPIANTO SIDEL n. 15842

La SIDEL S.p.a. ai sensi del D.P.R. 162/99 e D.P.R. 214/10 ha provveduto il giorno 29-01-2014
All'ispezione Periodica Straordinaria dell'impianto numero di fabbrica H0013
ubicato in CAMPOSALLIANO via S. MARCANI 30
di proprietà COMUNE - DIREZIONALE RI avente le seguenti caratteristiche:
marca ART-LIFT matricola impianto D18/2003 azionamento Elettrico Oleodinamico
portata 800 Kg Corsa 4,56 m Fermate n° 3 Velocità 0,10 (m/s)

Funi, catene o cinghie	<input type="checkbox"/> Regolari	<input type="checkbox"/> Fili rotti	<input type="checkbox"/> Non applicabile	<input checked="" type="checkbox"/> Prescrizioni
Dispositivi di chiusura, sicurezza e blocco	<input checked="" type="checkbox"/> Efficienti			<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Dispositivi di extra corsa e rallentamento	<input checked="" type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Paracadute, a vuoto e velocità ridotta	<input checked="" type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Limitatore di velocità	<input checked="" type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Condizione difese	<input checked="" type="checkbox"/> Regolari			<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Condizione di isolamento dei circuiti	<input checked="" type="checkbox"/> Regolari			<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Guasto a terra	<input checked="" type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Allarme/bidirezionale	<input checked="" type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Valvola di sovrappressione	<input type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Valvola di blocco	<input type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Ripescaggio	<input type="checkbox"/> Ha Funzionato	<input type="checkbox"/> Non ha funzionato		<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Tubazioni flessibili	<input type="checkbox"/> Regolari			<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Targhe ed avvisi	<input checked="" type="checkbox"/> Regolari			<input type="checkbox"/> Prescrizioni
Funzionamento dell'impianto	<input checked="" type="checkbox"/> Regolare			<input type="checkbox"/> Prescrizioni

RISCONTRANDO (per il significato dei codici eventualmente indicati, v. tergo)

Altre: 1) LE FUNI PRESENTANO UN TRATTO STREFFIATO CHE TENEBE SOTTO CONTROLLO ED INTERVENIRE ALLA OCCORRENZA
2) BATTERIE MANOVRA EMERGENZA NON EFFICIENTI

Note: NR. 458/96 - IMPIANTO DOTATO DI TELEALLARME
ISOLAMENTO VALORE MIN. 243 MΩ

Ditta incaricata della manutenzione: ESSENETI

Sono stati annotati o allegati gli esiti delle manutenzioni periodiche? Si No

Eventuali prescrizioni precedenti sono state ottemperate Si No

L'ascensore può essere mantenuto in esercizio? Si No

SIDEL S.p.A. Il Verificatore



Manuela Bobbi

Data Collaudo PIATTAFORMA

